











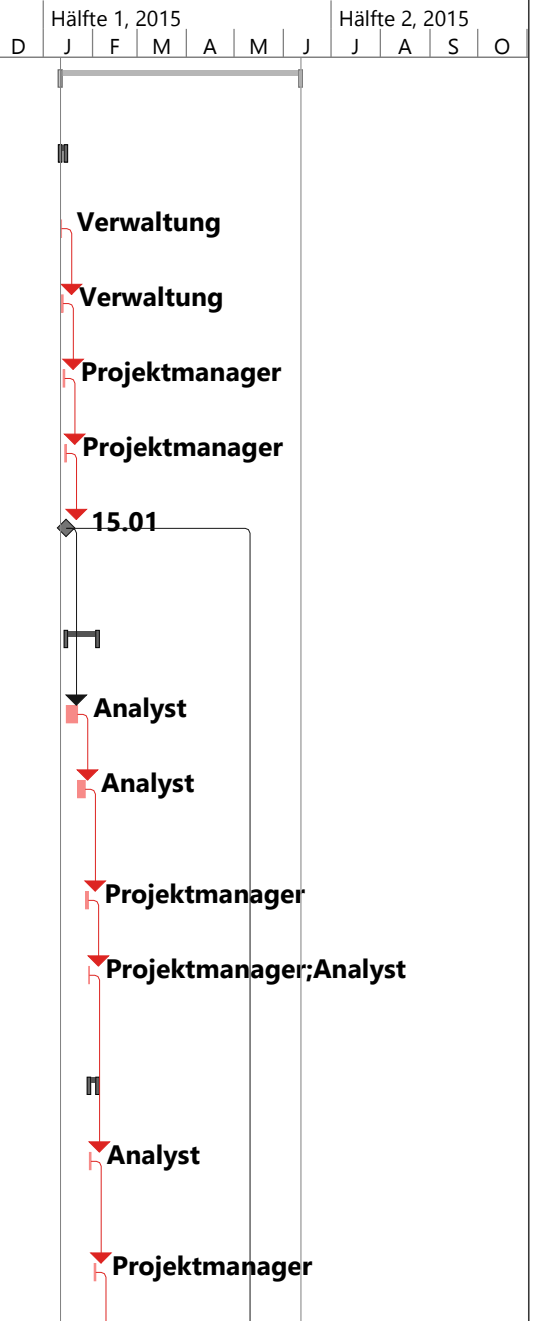

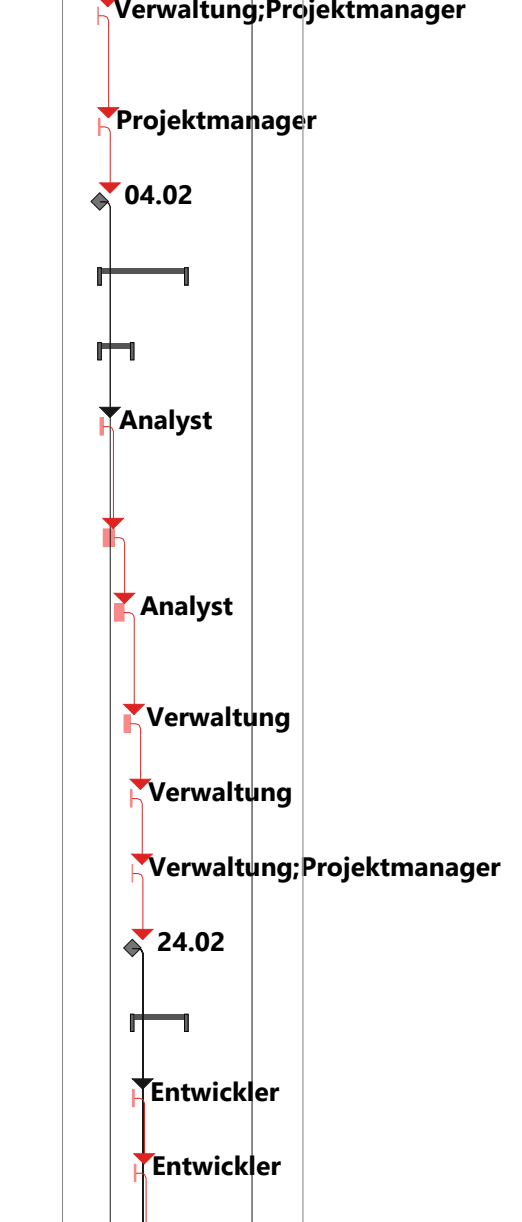

























Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Arbeit	Ressourcenna	Hälfte 1, 2015							Hälfte 2, 2015			
									D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
0		Software Entwicklung	98 Tage	Mon 12.01.15	Don 11.06.15		1 476 S...												
1		1 Umfang	3,5 Tage	Mon 12.01.15	Don 15.01.15		28 Std.												
2		1.1 Projektumfang ermitte	0,5 Tage	Mon 12.01.15	Mon 12.01.15		4 Std.	Verwaltung											
3		1.2 Projektunterstützung	1 Tag	Mon 12.01.15	Die 13.01.15 12:00	2	8 Std.	Verwaltung											
4		1.3 Vorläufige Ressourcen	1 Tag	Die 13.01.15 13:00	Mit 14.01.15 12:00	3	8 Std.	Projektmana											
5		1.4 Kernressourcen reserv	1 Tag	Mit 14.01.15	Don 15.01.15	4	8 Std.	Projektmana											
6		1.5 Definition des Projektumfangs abgeschlossen	0 Tage	Don 15.01.15 12:00	Don 15.01.15 12:00	5	0 Std.												
7		2 Anforderungen an Analyse/Software	14 Tage	Don 15.01.15	Mit 04.02.15 12:00		120 Std.												
8		2.1 Bedarfsanalyse durchf	5 Tage	Don 15.01.15	Don 22.01.15	6	40 Std.	Analyst											
9		2.2 Vorläufige Softwarespezifikationen entwerfen	3 Tage	Don 22.01.15 13:00	Die 27.01.15 12:00	8	24 Std.	Analyst											
10		2.3 Budgetentwurf erstelle	2 Tage	Die 27.01.15	Don 29.01.15	9	16 Std.	Projektmana											
11		2.4 Softwarespezifikationen/Bi mit Team überprüfen	0,5 Tage	Don 29.01.15 13:00	Don 29.01.15 17:00	10	8 Std.	Projektmana											
12		2.5 Software	3,5 Tage	Fre 30.01.15	Mit 04.02.15		32 Std.												
13		2.5.1 Feedback zu Softwarespezifikationen aufnehmen	1 Tag	Fre 30.01.15 08:00	Fre 30.01.15 17:00	11	8 Std.	Analyst											
14		2.5.2 Lieferzeitplan defi	1 Tag	Mon 02.02.15	Mon 02.02.15	13	8 Std.	Projektmana											













































Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Arbeit	Ressourcenna	Hälfte 1, 2015							Hälfte 2, 2015			
										D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
15			2.5.3 Genehmigungen zur Weiterführung einholen (Konzept,	0,5 Tage	Die 03.02.15 08:00	Die 03.02.15 12:00	14	8 Std.	Verwaltung;											
16			2.5.4 Erforderliche Ressourcen reservieren	1 Tag	Die 03.02.15 13:00	Mit 04.02.15 12:00	15	8 Std.	Projektmana											
17			2.6 Analyse abgeschlossen	0 Tage	Mit 04.02.15	Mit 04.02.15	16	0 Std.												
18			3 Programmierung	38,5 Tage	Mit 04.02.15	Mon 30.03.15		344 Std.												
19			3.1 Programmierung vorbereiten	14,5 Tage	Mit 04.02.15	Die 24.02.15		80 Std.												
20			3.1.1 Vorläufige Softwarespezifikationen überprüfen	2 Tage	Mit 04.02.15 13:00	Fre 06.02.15 12:00	17	16 Std.	Analyst											
21			3.1.2 Funktionale Spezifikationen	5 Tage	Fre 06.02.15 13:00	Fre 13.02.15 12:00	20	0 Std.												
22			3.1.3 Prototyp basierend auf funktionalen	4 Tage	Fre 13.02.15 13:00	Don 19.02.15 12:00	21	32 Std.	Analyst											
23			3.1.4 Umsetzung der funktionalen	2 Tage	Don 19.02.15	Mon 23.02.15	22	16 Std.	Verwaltung											
24			3.1.5 Feedback in funktionale	1 Tag	Mon 23.02.15	Die 24.02.15 12:00	23	8 Std.	Verwaltung											
25			3.1.6 Genehmigung zur Weiterführung einholen	0,5 Tage	Die 24.02.15 13:00	Die 24.02.15 17:00	24	8 Std.	Verwaltung;											
26			3.1.7 Entwurf abgeschlossen	0 Tage	Die 24.02.15	Die 24.02.15	25	0 Std.												
27			3.2 Programmierung umsetzen	24 Tage	Mit 25.02.15	Mon 30.03.15		264 Std.												
28			3.2.1 Umsetzung der funktionalen	1 Tag	Mit 25.02.15 08:00	Mit 25.02.15 17:00	26	8 Std.	Entwickler											
29			3.2.2 Modulare/gestufte	1 Tag	Don 26.02.15	Don 26.02.15	28	8 Std.	Entwickler											











Seite 2

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Arbeit	Ressourcenna	Hälfte 1, 2015							Hälfte 2, 2015			
									D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
30		 3.2.3 Entwicklungsteam	1 Tag	Fre 27.02.15	Fre 27.02.15	29	8 Std.	Entwickler											
31		 3.2.4 Code entwickeln	15 Tage	Mon 02.03.15	Fre 20.03.15	30	120 Std.	Entwickler											
32		 3.2.5 Testphase Entwickler (primäre	15 Tage	Die 10.03.15 08:00	Mon 30.03.15	31EA-60	120 Std.	Entwickler											
33		 3.2.6 Entwicklung abges	0 Tage	Mon 30.03.15	Mon 30.03.15	32	0 Std.												
34		 4 Tests	51 Tage	Mit 25.02.15	Fre 08.05.15		280 Std.												
35		 4.1 Einheitentestpläne anhand von Produktspezifikationen	4 Tage	Mit 25.02.15 08:00	Mon 02.03.15 17:00	26	32 Std.	Tester											
36		 4.2 Integrationstestpläne anhand von Produktspezifikationen	4 Tage	Mit 25.02.15 08:00	Mon 02.03.15 17:00	26	32 Std.	Tester											
37		 4.3 Einheitentests	15 Tage	Die 31.03.15	Die 21.04.15		120 Std.												
38		 4.3.1 Modularen Code ü	5 Tage	Die 31.03.15	Die 07.04.15	35;33;3	40 Std.	Tester											
39		 4.3.2 Komponentenmoc	2 Tage	Mit 08.04.15	Don 09.04.15	33;38	16 Std.	Tester											
40		 4.3.3 Abweichungen an	3 Tage	Fre 10.04.15	Die 14.04.15	39	24 Std.	Tester											
41		 4.3.4 Code ändern	3 Tage	Mit 15.04.15	Fre 17.04.15	40	24 Std.	Tester											
42		 4.3.5 Geänderten Code	2 Tage	Mon 20.04.15	Die 21.04.15	41	16 Std.	Tester											
43		 4.3.6 Einheitentests abg	0 Tage	Die 21.04.15	Die 21.04.15	42	0 Std.												
44		 4.4 Integrationstests	12 Tage	Mit 22.04.15	Fre 08.05.15		96 Std.												
45		 4.4.1 Modulintegration	5 Tage	Mit 22.04.15	Die 28.04.15	43	40 Std.	Tester											



Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Arbeit	Ressourcenna	Hälfte 1, 2015							Hälfte 2, 2015			
										D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
46			4.4.2 Abweichungen an	2 Tage	Mit 29.04.15	Don 30.04.15	45	16 Std.	Tester							Tester				
47			4.4.3 Code ändern	3 Tage	Mon 04.05.15	Mit 06.05.15	46	24 Std.	Tester							Tester				
48			4.4.4 Geänderten Code	2 Tage	Don 07.05.15	Fre 08.05.15	47	16 Std.	Tester							Tester				
49			4.4.5 Integrationstests	0 Tage	Fre 08.05.15	Fre 08.05.15	48	0 Std.								08.05				
50			5 Schulung	48 Tage	Mit 25.02.15	Die 05.05.15		256 Std.												
51			5.1 Schulungsspezifikation	3 Tage	Mit 25.02.15	Fre 27.02.15	26	24 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
52			5.2 Schulungsspezifikation	3 Tage	Mit 25.02.15	Fre 27.02.15	26	24 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
53			5.3 Vermittlungsmethode	2 Tage	Mit 25.02.15	Don 26.02.15	26	16 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
54			5.4 Schulungsunterlagen e	15 Tage	Die 31.03.15	Die 21.04.15	51;33;5	120 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
55			5.5 Nutzbarkeitsstudie für	4 Tage	Mit 22.04.15	Mon 27.04.15	54	32 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
56			5.6 Schulungsunterlagen fr	3 Tage	Die 28.04.15	Don 30.04.15	55	24 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
57			5.7 Vermittlungsmechanis	2 Tage	Mon 04.05.15	Die 05.05.15	56	16 Std.	Schulungslei							Schulungsleiter				
58			5.8 Schulungsunterlagen fr	0 Tage	Die 05.05.15	Die 05.05.15	57	0 Std.								05.05				
59			6 Dokumentation	30,5 Tage	Mit 25.02.15	Don 09.04.15		304 Std.												
60			6.1 Hilfespezifikation erste	1 Tag	Mit 25.02.15	Mit 25.02.15	26	8 Std.	Technische I							Technische Kommunikation				
61			6.2 Hilfespezifikation erste	15 Tage	Mit 11.03.15	Mit 01.04.15	60;31E	120 Std.	Technische I							Technische Kommunikati				
62			6.3 Hilfedokumentation ük	3 Tage	Mit 01.04.15	Die 07.04.15	61	24 Std.	Technische I							Technische Kommunikati				

Nr.		Vorgangssymbol	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgangsnummer	Arbeitsaufwand	Ressourcennamen	Hälfte 1, 2015							Hälfte 2, 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
63			6.4 Feedback zur Hilfedoku	2 Tage	Die 07.04.15	Don 09.04.15	62	16 Std.	Technische I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Arbeit	Ressourcenna	Hälfte 1, 2015												Hälfte 2, 2015				
										D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O						
80			8.6 Bereitstellung abgesch	0 Tage	Mon 08.06.15	Mon 08.06.15	79	0 Std.																		
81			9 Abnahme nach Implementi	3 Tage	Die 09.06.15	Don 11.06.15		32 Std.																		
82			9.1 Erfahrungen dokumen	2 Tage	Die 09.06.15	Mit 10.06.15	80	16 Std.	Projektmana																	
83			9.2 An Teammitglieder we	1 Tag	Mit 10.06.15	Mit 10.06.15	82AA+1	8 Std.	Projektmana																	
84			9.3 Team für Softwarepfle	1 Tag	Don 11.06.15	Don 11.06.15	82;83	8 Std.	Projektmana																	
85			9.4 Abnahme nach Implern	0 Tage	Don 11.06.15	Don 11.06.15	84	0 Std.																		
86			10 Vorlage für Softwareentwi	0 Tage	Don 11.06.15	Don 11.06.15	85	0 Std.																		

